




ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

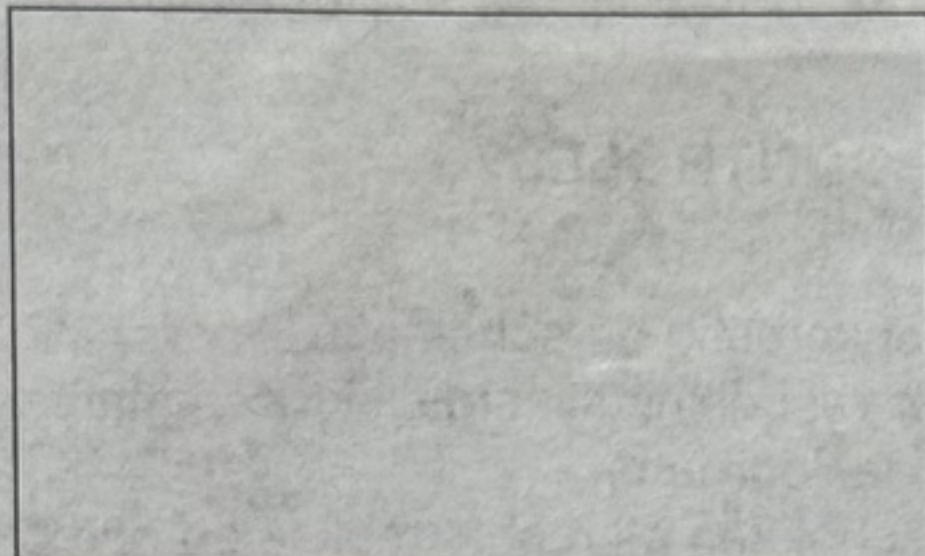

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Vlasst 41
Meeswijk

EIGENAAR: Bagi

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: idem

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 11/10/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~bezoek volgens:

(AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art. 276~~) (~~AREI art. 276bis~~) (~~ARAB art. 262~~) (~~K.B. 26.2008~~) (~~T.B. art. 231~~) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~verkoop~~ wooneenheid: Type der lokalen: H111

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Alg. schakelaar: type du 40A 10,3

Type van de aardelektrode: IUS - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT _____

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 26; RA: 7,5 Ohm; RI tot 210 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

Nota: - Bad / Douche / Vul arm / kerken nog te plaatsen
- aarding gas/wat nog aan buiten

PROCES-VERBAAL OVER HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdeler	
naam:	
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/10/2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

180
Van Duingene

De directeur,

