

Методологія формування та управління Проектним портфелем публічних інвестицій (ПППІ) громади

Від хаотичних «списків
бажань» до системного
залучення інвестицій.



Список бажань (Wishlist)



Проектний портфель (ПППІ)



4 Ознаки справжнього проекту

Головна помилка — плутати проект із поточною діяльністю (напр. 'закупівля пального')



Чітка мета: Вимірюваний результат (не 'ремонт доріг', а 'термомодернізація ліцею №1').



Обмеженість у часі: Фіксовані дати початку та завершення.



Обмеженість ресурсів: Визначений бюджет та команда.



Унікальність: Створення нового активу з прив'язкою до локації.

Життєвий цикл публічної інвестиції (ПІП)



Логічний ланцюг планування



УВАГА: Жоден проєкт не потрапить до ЄПП, якщо його напрям не визначено у Середньостроковому плані (СПІ). Для отримання державних коштів СПІ громади має корелюватися з СПІ держави.

ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ ТА ПРОГРАМ

ПРИНЦИП ВІДПОВІДНОСТІ СТРАТЕГІЧНИМ ДОКУМЕНТАМ

Обов'язкова відповідність стратегії громади та СПІ (напрямок, цільові показники)

Було: нові проєкти могли не відповідати жодному стратегічному документу, не впливати на пріоритети уряду тощо

ПРИНЦИП ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ

Спочатку - підготовка обґрунтувань та оцінка (доведення доцільності), потім - витрачання коштів

Було: витрачання коштів на розробку ПКД, відсутність у подальшому коштів на реалізацію (результат – марне витрачання публічних коштів)

ПРИНЦИП МУЛЬТИПРОФІЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ

- Секторальна оцінка
- Експертна оцінка
- Затвердження інвестиційною радою

Було: розфокусування уваги серед різних проєктів, відсутність розуміння, які найпріоритетніші і які критерії оцінки

Логічна архітектура портфелю



Проект, який не має прямого зв'язку з індикаторами Стратегії, не повинен отримувати фінансування.

3 Виміри балансування портфелю

Вісь 3: Баланс джерел фінансування


Диверсифікація: Бюджет ОМС + Державні субвенції + Міжнародні гранти.

Вісь 1: Баланс цілей


- **Економічні:** Генерують дохід (індустріальні парки).
- **Соціальні:** Вимагають утримання (школи, лікарні). Мінімум 20-30% інвестицій мають йти в економіку.

Вісь 2: Баланс ризиків та складності


Поеднання "Швидких перемог" (до 6 міс.) із масштабними інфраструктурними проектами.

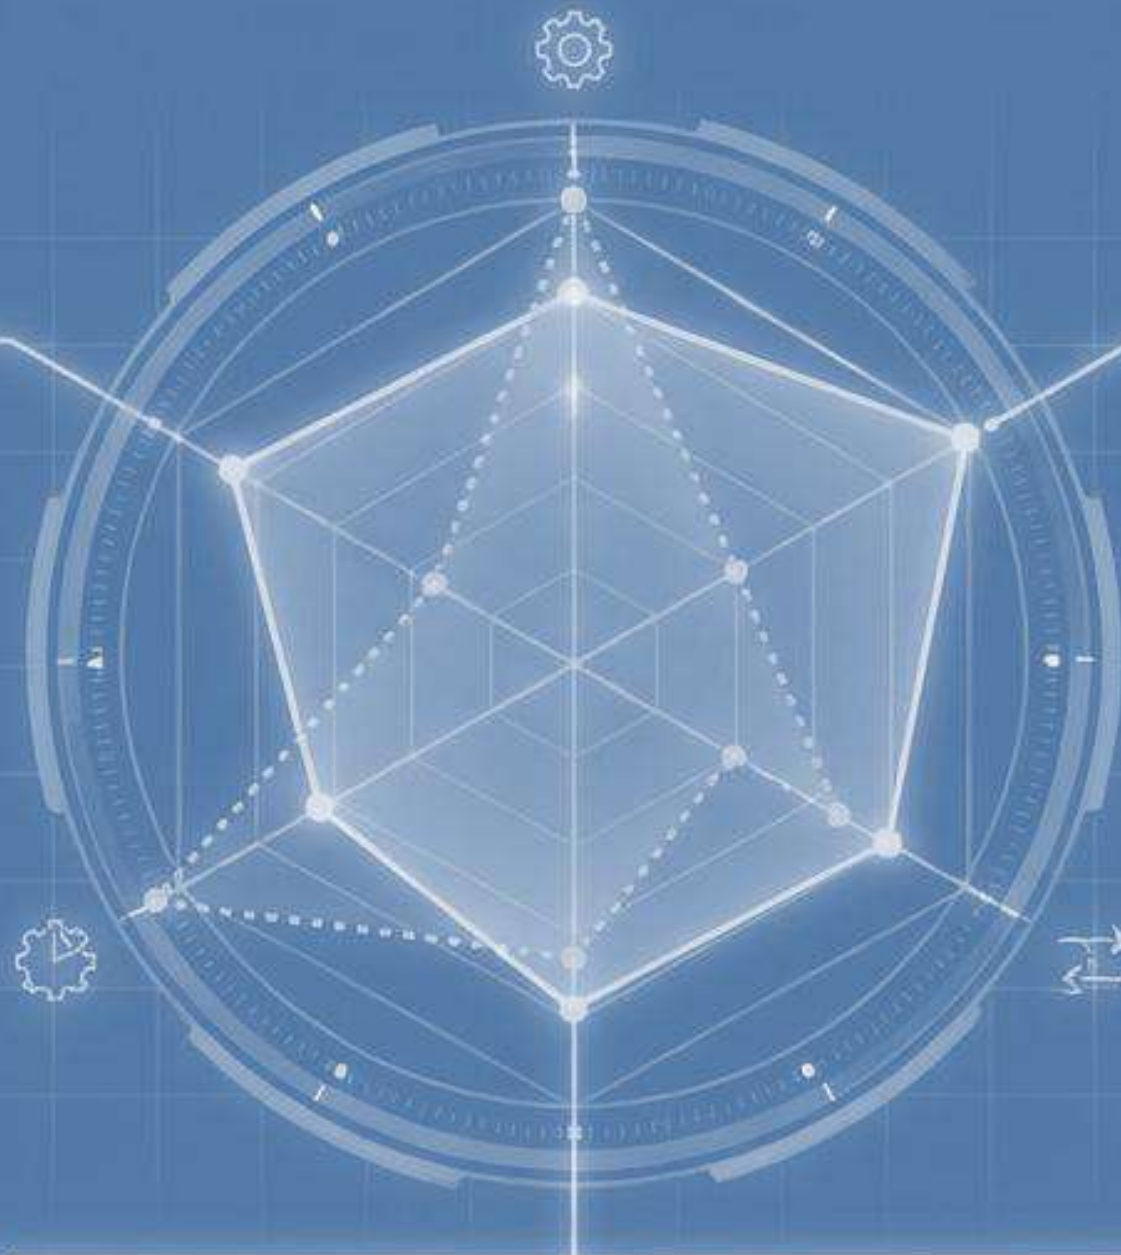

Часові горизонти

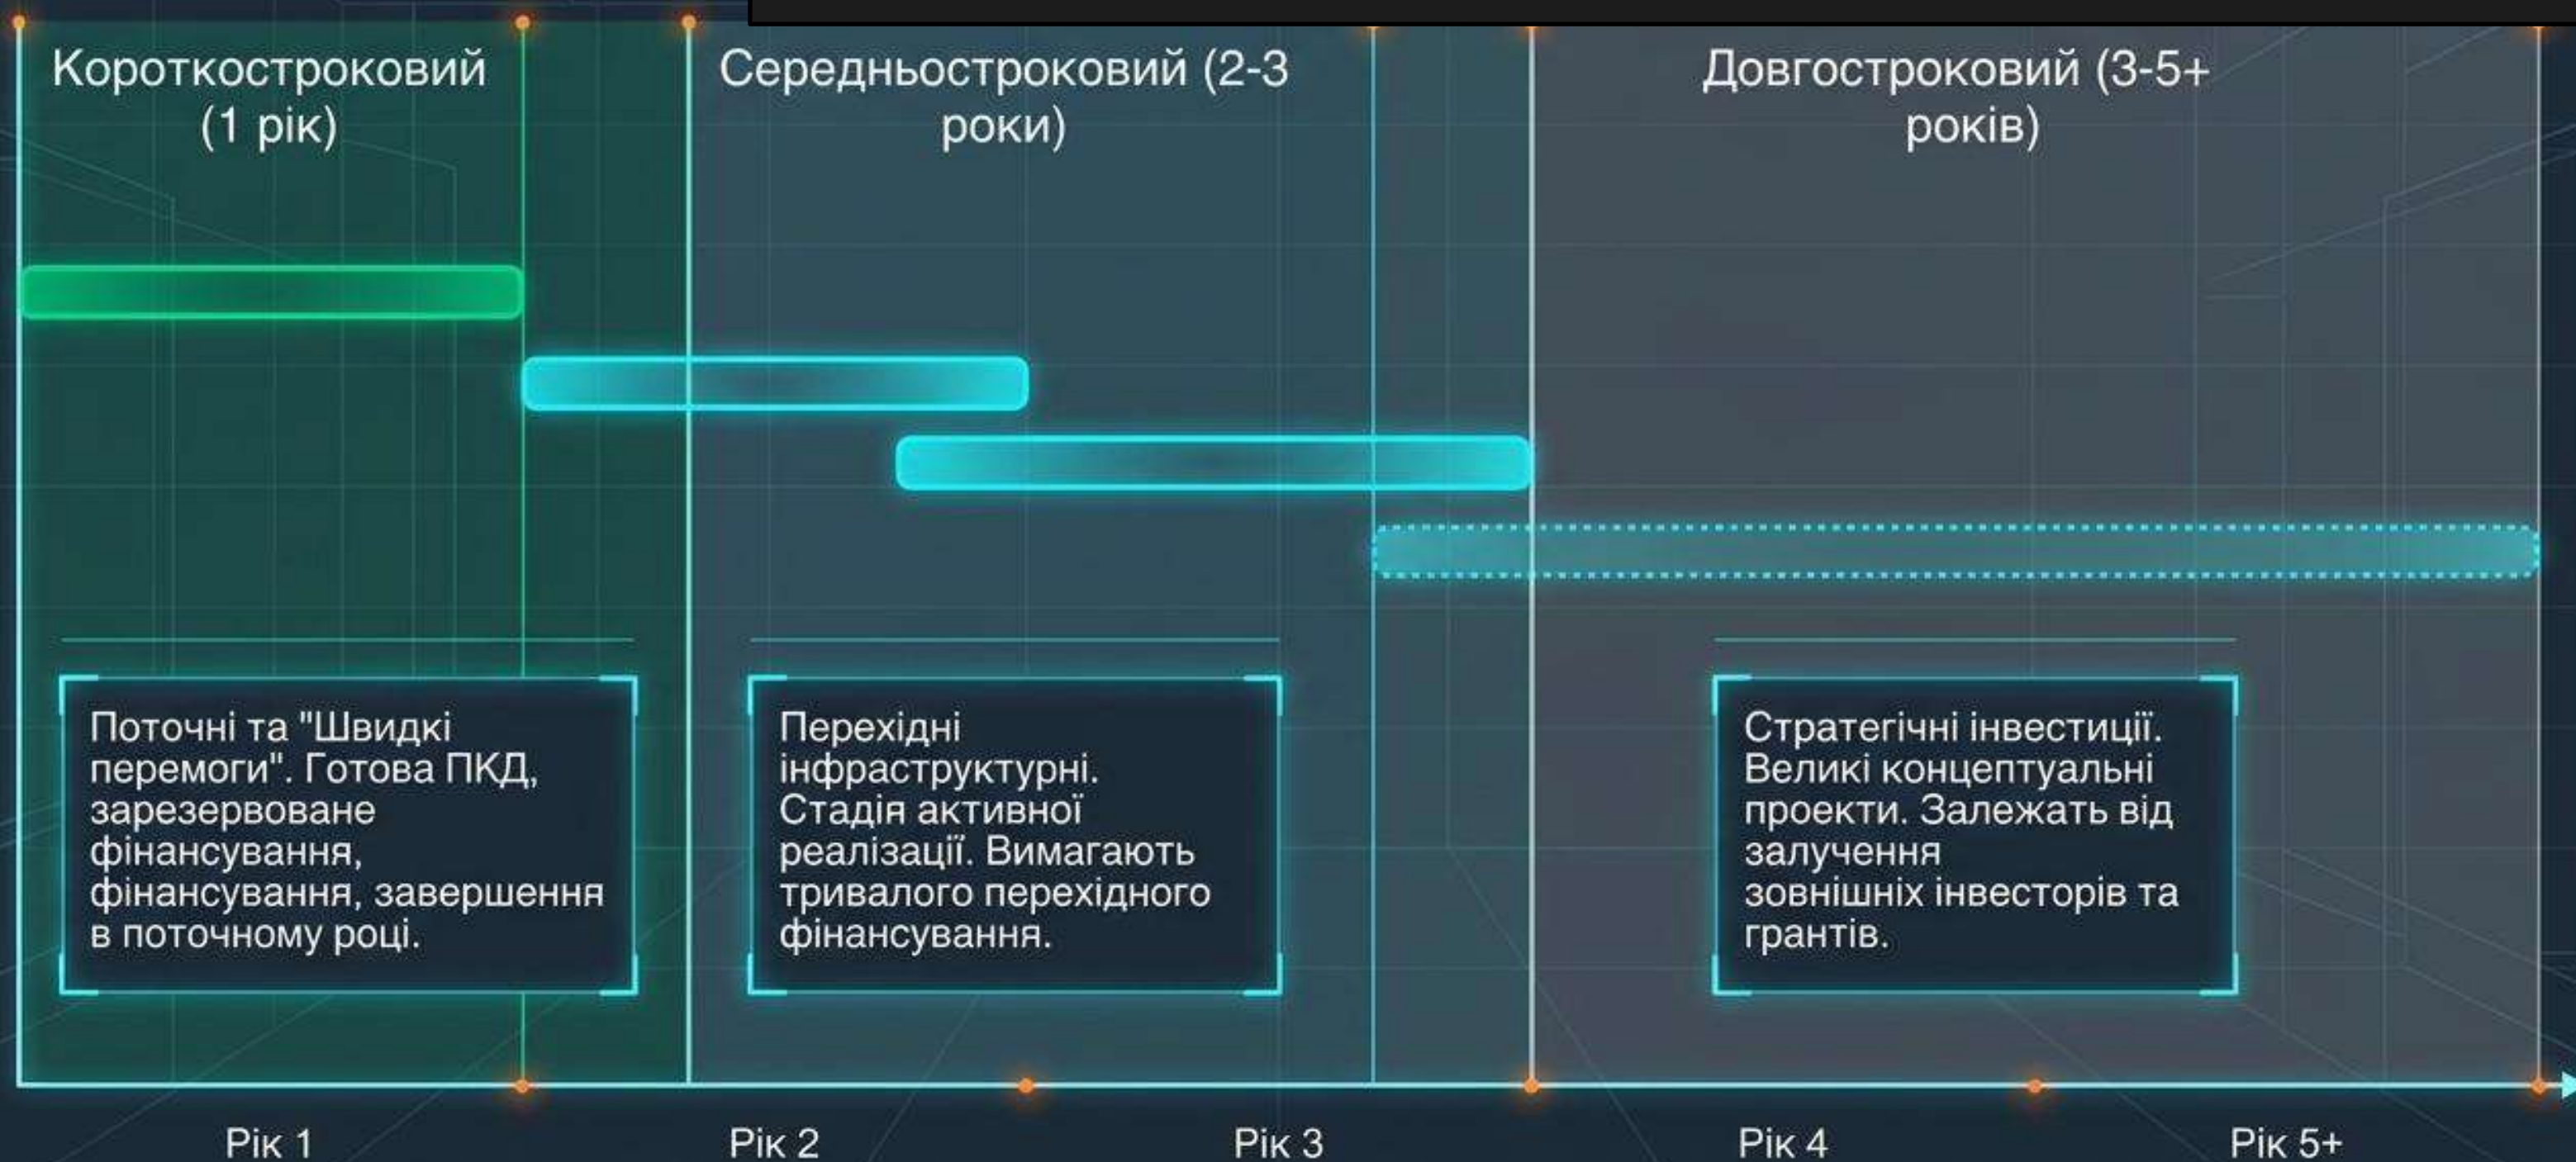

Алгоритм відбору: Треступеневий фільтр інвестицій (РІМ)

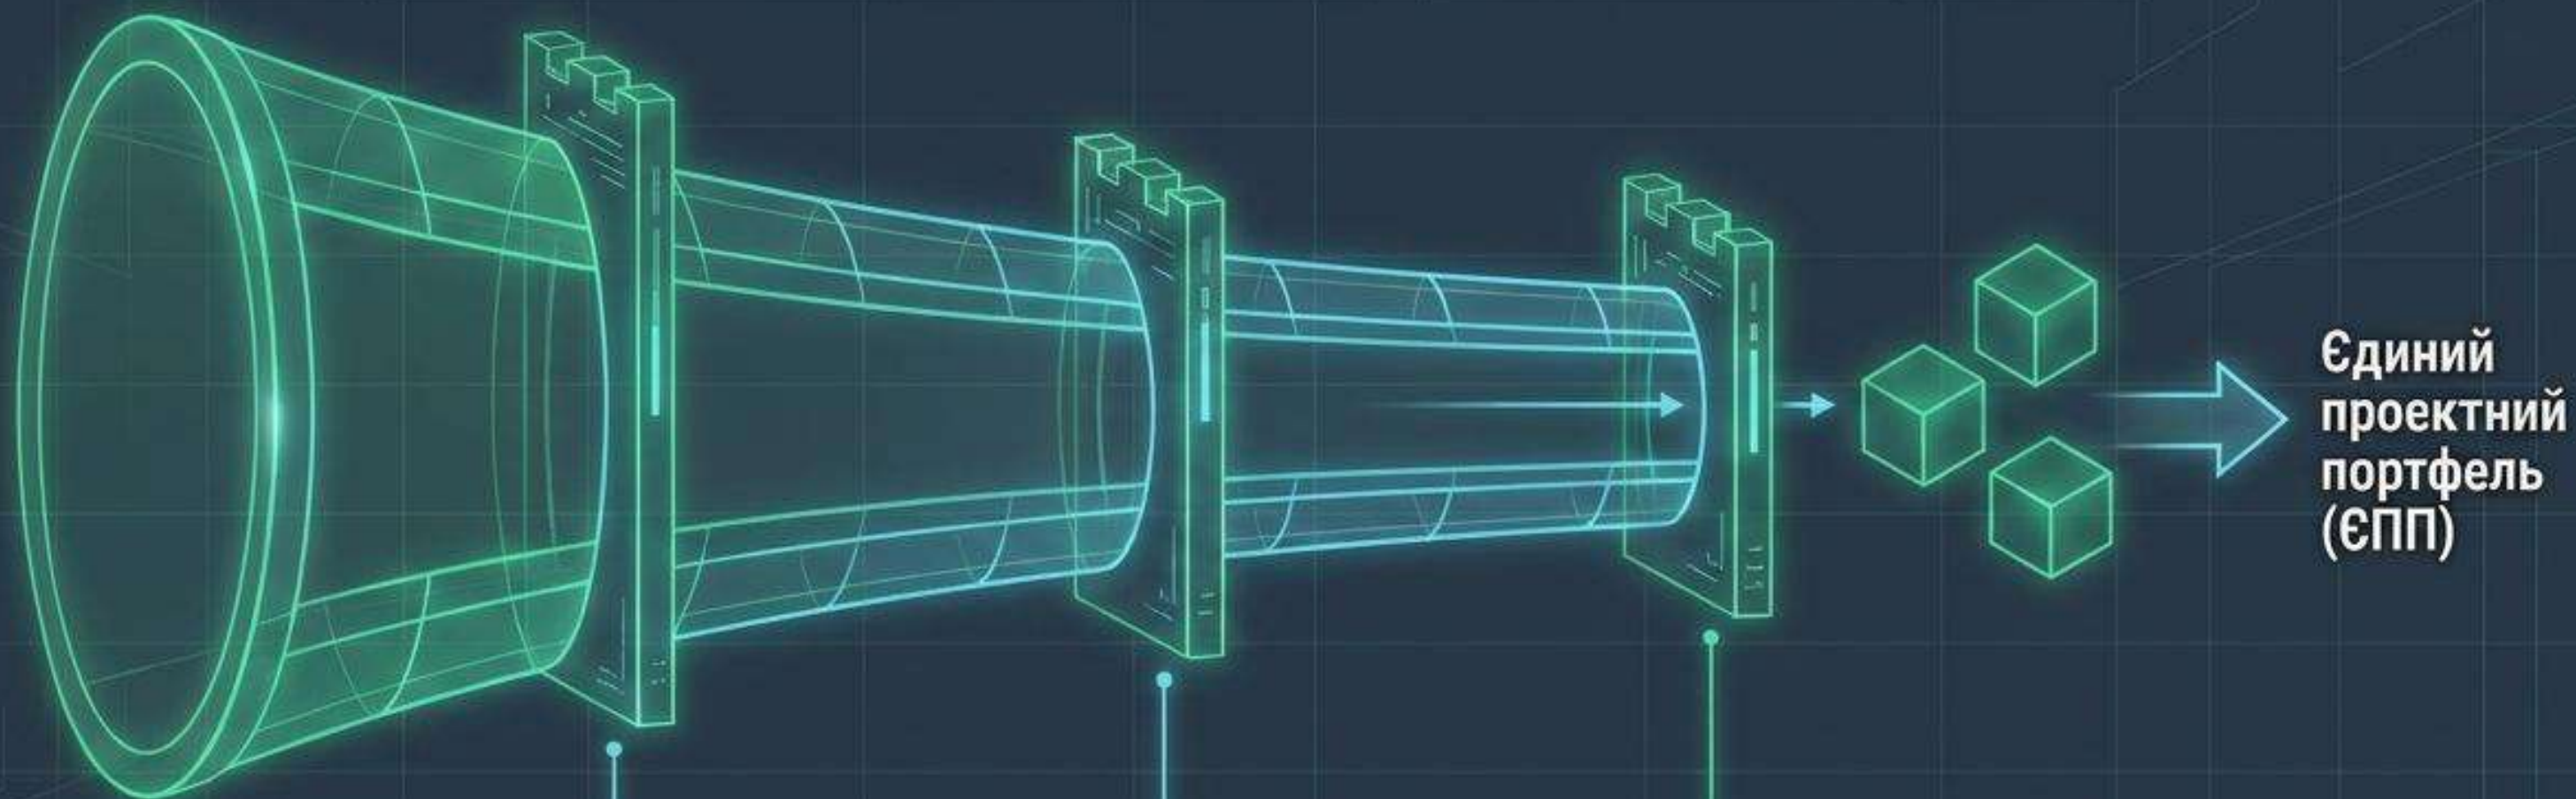

Крок 1: Скринінг у DREAM



Автоматичний фільтр:
легітимність напряму, технічна
комплектність картки,
блокування дублювання.

Крок 2: Галузева оцінка



Профільні підрозділи ОМС:
обґрунтованість попиту,
відповідність ДБН (укриття,
інклюзивність),
пріоритетність усередині галузі.

Крок 3: Крос-галузева експертиза



Експертний скоринг:
математична оцінка фінансів,
економіки та готовності.
Перехід до ЄПП.

Екосистема ідей: 4 джерела наповнення портфелю

ОМС (Органи місцевого самоврядування)



Базове ядро: Стратегія, галузеві програми, Громадський бюджет (базова інфраструктура).

Комунальні підприємства (КП)



Модернізація інфраструктури (водоканали, тепломережі).
Потребують інтеграції для залучення кредитів ЄІБ/ЄБРР.

Публічно-приватне партнерство (ПРП)



Спільні проекти з бізнесом (ESCO контракти, концесії). Знімає 100% навантаження з місцевого бюджету.

Міжмуніципальне співробітництво (ММС)



Об'єднання ресурсів кількох громад для масштабних грантів (спільні заводи, дороговартісна техніка).

Обґрунтування інвестиції: The Five Case Model



Підготовка публічних інвестиційних проєктів (ПІП) та програм публічних інвестицій

Стратегічне обґрунтування публічного інвестиційного проєкту

1. Переконайтеся, що проєкт є стратегічно доцільним

2. Визначте мету та цілі проєкту

3. Визначте проблему (потребу), яку має вирішувати проєкт

4. Проаналізуйте поточну ситуацію з наданням послуги / забезпеченням інфраструктури (за наявності), існуючий і потенційний попит

5. Визначте, досягненню яких Цілей сталого розвитку сприятиме проєкт

6. Зазначте відповідність наскрізним цілям

7. Проаналізуйте можливі обмеження та ризики

Підготовка публічних інвестиційних проєктів (ПІП) та програм публічних інвестицій

Економічне обґрунтування публічного інвестиційного проєкту

1. Визначте соціально-економічний ефект від реалізації проєкту
2. Проведіть базовий аналіз впливу проєкту на навколишнє середовище та зміну клімату
3. Проаналізуйте проєкт на відповідність принципам стійкості та інклюзивності
4. Визначте альтернативні рішення для реалізації проєкту
5. Проаналізуйте визначені альтернативні рішення

Підготовка публічних інвестиційних проєктів (ПІП) та програм публічних інвестицій

Комерційне обґрунтування публічного інвестиційного проєкту

1. Оцініть ринок постачальників та підрядників для визначених предметів закупівель проєкту

2. Проаналізуйте доступні варіанти закупівель

Підготовка публічних інвестиційних проєктів (ПІП) та програм публічних інвестицій

*Наказ Міністерства фінансів України
від 23 червня 2025 р. № 316*

Фінансове обґрунтування публічного інвестиційного проєкту

1. Розрахуйте орієнтовну вартість проєкту

2. Оцініть можливості отримання доходу від реалізації проєкту

3. Проаналізуйте цінову доступність послуг для споживачів

4. Визначте джерела і механізми фінансового забезпечення проєкту

5. Проаналізуйте придатність проєкту для реалізації через механізм державно-приватного партнерства

Підготовка публічних інвестиційних проєктів (ПІП) та програм публічних інвестицій

Управлінське обґрунтування публічного інвестиційного проєкту

1. Визначте попередню структуру команди управління проектом

2. Оцініть наявність компетенцій та експертизи

3. Оцініть ризики для етапу підготовки проекту та сформууйте план управління ними

Нові правила гри: Реформа РІМ та міжнародні стандарти

Перехід від радянського «освоєння бюджету» до європейського «управління ефективністю».

Єдина екосистема DREAM




Немає в системі з повним пакетом відкритих даних — немає фінансування. Це обов'язкове перше вікно.

Гармонізація з МФО



Обов'язкова оцінка за стандартами ESG (екологія, соціум, управління), Green Transition та 100% безбар'єрність.

Триступневий відбір



Кінець "ідей без розрахунків". Перехід від "ідеї ремонту" до математичного скорингу: Концепція
→ Pre-Feasibility
→ Повне ТЕО/ПКД.

Типові помилки та їх усунення

Рівень 1: Стратегічні розриви



Симптоми

"Wishlist" без пріоритетів, політичні проекти депутатів, ігнорування думки мешканців, відсутність економічного фокусу.



Системне рішення

Впровадження жорсткого математичного скорингу, передача відбору незалежній експертній раді, обов'язкові публічні консультації, фіксація 30% квоти на економічні проекти.

Рівень 2: Фінансові пастки



Симптоми

"Цвинтар ПКД" (лежать роками), ігнорування експлуатаційних витрат (OPEX), ставка лише на одне джерело грошей.



Системне рішення

Не розробляти ПКД без прорахованого Фінансового обґрунтування (Financial Case) на 10 років уперед; диверсифікація (власні кошти + запозичення + гранти).

Рівень 3: Управлінський колапс



Симптоми

Нереалістичні бюджети та зупинка робіт, брак проектних менеджерів, провал вимог безбар'єрності.



Системне рішення

Створення РМО (Проектного офісу), закладання 10–15% резервного фонду на ризики, "нульова толерантність" до порушення інклюзивних ДБН на етапі ініціації.

Крок 3. Доведення доцільності та Оцінка

Головне правило: Спочатку — підготовка обґрунтувань (вартість рахується на повний життєвий цикл), потім — витрачання коштів.

1. Стратегічне

2. Економічне

1. Стратегічне

3. Комерційне
(крім програм)

4. Фінансове



Триступеневий фільтр (Сканер):


- **Скринінг:**
Автоматизована перевірка на відповідність критеріям.
- **Галузева оцінка:**
Проводиться профільним міністерством
→ Включення до Секторального портфеля.
- **Експертна оцінка:**
Мінекономіки, Мінфін, Мінрозвитку.

Deep Dive: Крос-галузева експертиза (Скоринг)



Результат: Структура Єдиного проектного портфеля (ЄПП)

Єдине джерело правди для громади та міжнародних донорів.

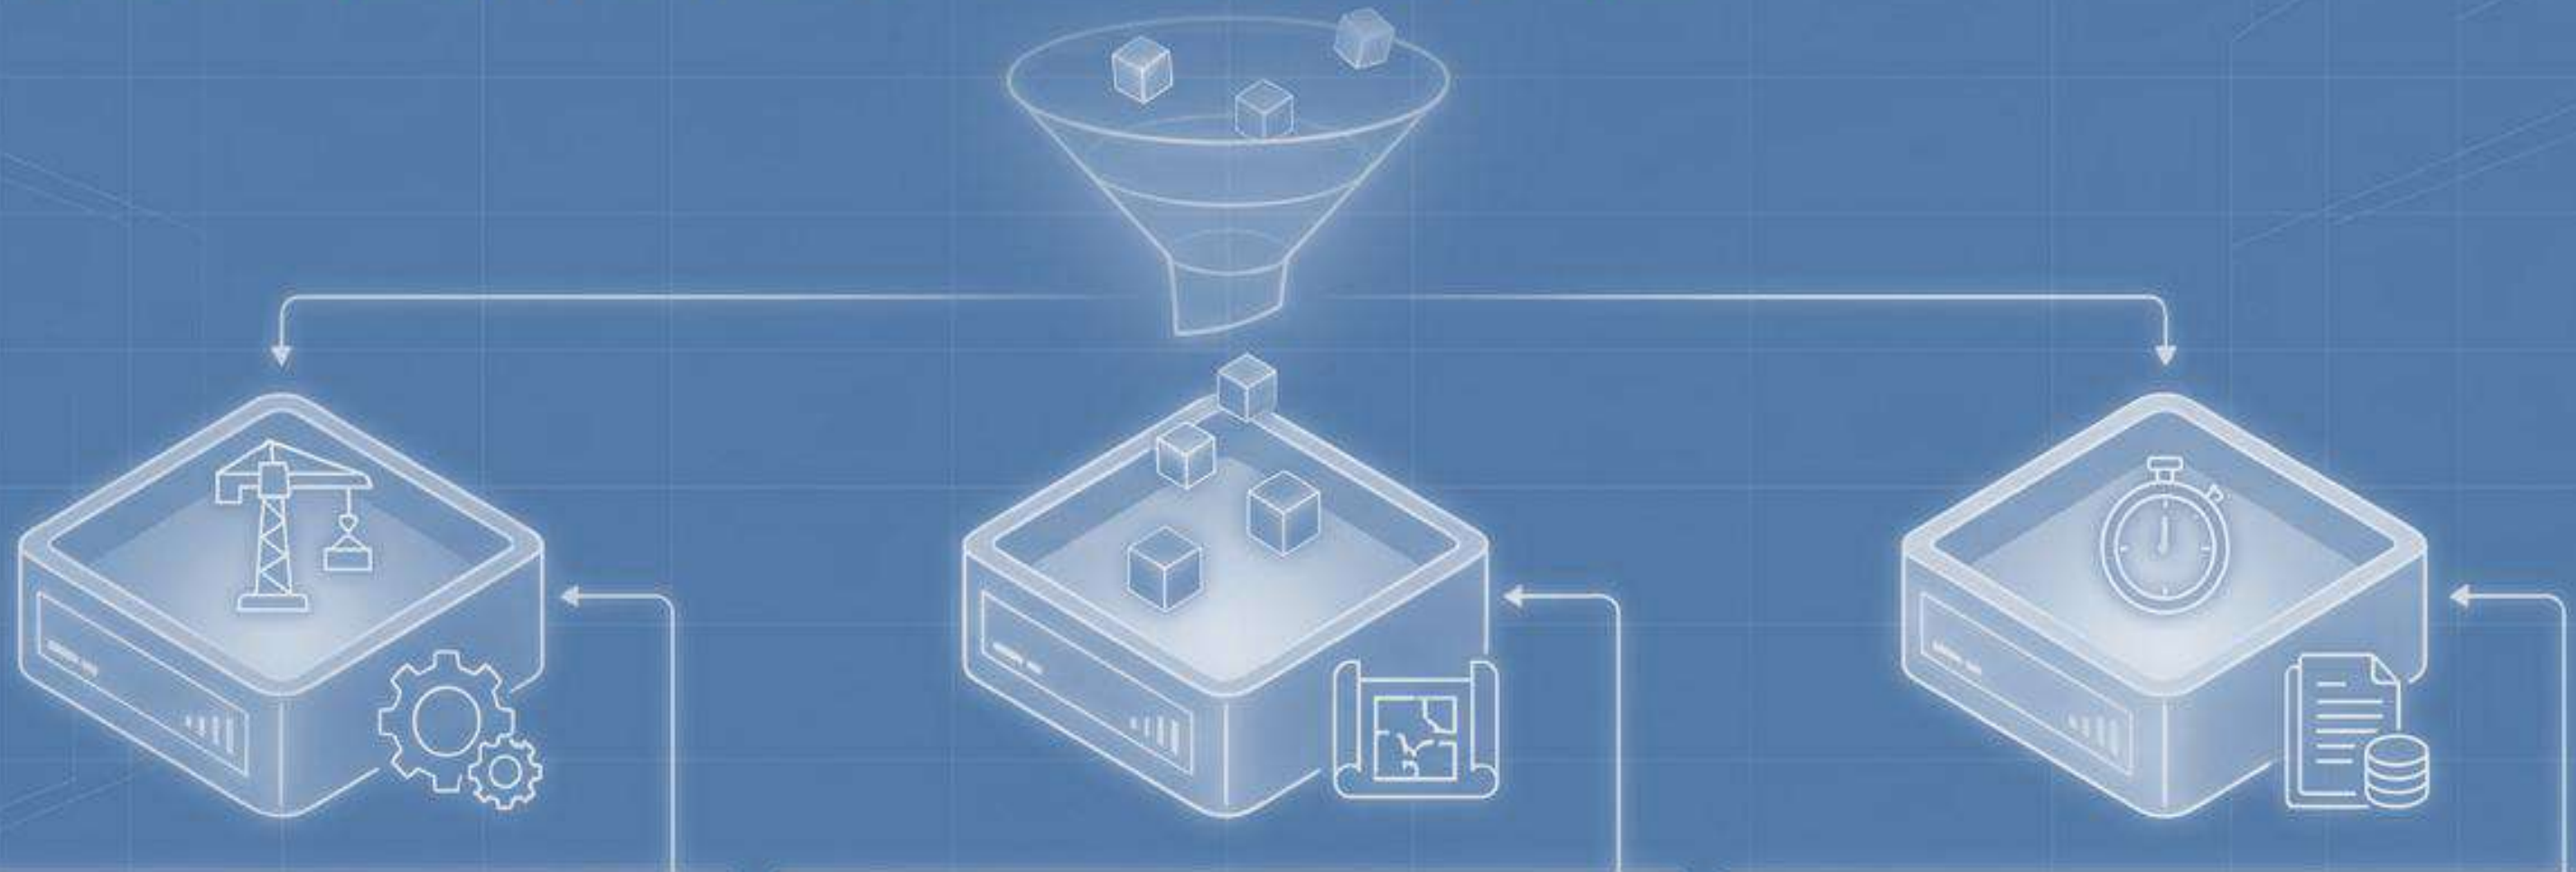

Пул 1: Активний (Проекти в роботі)

- Статус: 100% готовність документів + забезпечене фінансування.
- Дія: Перебувають на стадії тендерів або безпосереднього будівництва.

Пул 2: Підготовчий (Pipeline)

- Статус: Високий бал скорингу, але потребують доопрацювання (розробка ТЕО/ПКД, відведення землі).
- Дія: Сюди громада має першочергово спрямовувати свій 'бюджет розвитку', щоб підготувати проекти для донорів.

Пул 3: Резервний (В очікуванні вікна)

- Статус: Стратегічно важливі, 100% готові (є експертиза), але наразі відсутні гроші.
- Дія: Першими подаються, щойно відкривається новий грант чи з'являється інвестор.

ЄПП як ваш “Інвестиційний магніт”

Від прохача до менеджера

Міжнародні донори не фінансують хаотичні запити. Прозорий ЄПП у системі DREAM є гарантом довіри та першочергового виділення грантів.

World Bank

USAID

Громада з ЄПП

NEFCO

EIB

Стабільність

Системний портфель забезпечує спадкоємність влади — зміна керівництва не зупиняє стратегічний розвиток.



Створіть свій Активний пул вже сьогодні.

Громада, яка керує даними та обґрунтуваннями, завжди виграє конкуренцію за ресурси.

Крок 4. ЄПП: Фінішна пряма інвестування

Що таке ЄПП:

Портфель проектів, що пройшли експертну оцінку та схвалені Стратегічною інвестиційною радою.

Критична умова включення:

В ЄПП потрапляють **ЛИШЕ** ті проекти з секторального портфеля, які мають **ПІДТВЕРДЖЕНІ джерела фінансування** (укладені угоди, договори тощо). Це не «список побажань».

Динамічність (Оновлення щокварталу):

- Проекти моніторяться. Зміна вартості >10% або зміна технічних рішень вимагає повторної оцінки.
- Виключення можливе за порушення строків або недостовірну інформацію.

ІНСТРУКЦІЯ

щодо формування єдиного проєктного портфеля (ЄПП) для громад та регіонів відповідно до реформи управління публічними інвестиціями

Оновлено 22.04.2026

Інструкція регулярно оновлюється. Будь ласка, використовуйте електронну версію, щоб завжди мати актуальну інформацію.

Ця інструкція створена за фінансової підтримки Програми допомоги з міжнародного розвитку від Уряду Великої Британії. Зміст є винятковою відповідальністю Open Contracting Partnership та Проектного Офісу DREAM; висловлені погляди не обов'язково відображають офіційну політику Уряду Великої Британії.



Міністерство розвитку
громад та територій
України



UK International
Development
Partnership | Progress | Prosperity



EURASIA
FOUNDATION



DREAM



OPEN
CONTRACTING
PARTNERSHIP

ІНСТРУКЦІЯ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ ТА ПРОГРАМ ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СИСТЕМІ DREAM

ДЛЯ ГРОМАД ТА РЕГІОНІВ

Оновлено 26.02.2026

Інструкція регулярно оновлюється. Будь ласка, використовуйте електронну версію, щоб завжди мати актуальну інформацію.

Ця інструкція створена за фінансової підтримки Програми допомоги з міжнародного розвитку від Уряду Великої Британії. Зміст є винятковою відповідальністю Open Contracting Partnership та Проектного Офісу DREAM; висловлені погляди не обов'язково відображають офіційну політику Уряду Великої Британії.



Міністерство розвитку
громад та територій
України



UK International
Development
Partnership | Progress | Prosperity



EURASIA
FOUNDATION



DREAM



OPEN
CONTRACTING
PARTNERSHIP

<https://docs.google.com/document/d/1ThbZB4XhvzTJ-0vQ5mASfQ4gdfBLjIEC4HwQb46tQ8Q/edit?tab=t.0>

https://docs.google.com/document/d/1bN_OZjtYNmYqfzG9y4tDQJbLWYewgQ39W-XPILvPkgo/edit?tab=t.0

Мета та процес відбору ПІП

Основна мета формування ЄПП — прозорий відбір найкращих ініціатив для фінансування. Архітектура процесу в DREAM побудована як естафета: кожен етап передбачає передачу відповідальності від одного ключового актора до іншого, аж до фінального затвердження.

1. Делегування
(Головний орган)



3. Подача заявок
(Секторальний менеджер)



5. Аналітика
(Відповідальний за ЄПП)



7. Фіксація
(Відповідальний за ЄПП)



2. Правила гри
(Відповідальний за ЄПП)



4. Експертиза
(Оцінювач)



6. Офлайн-рішення
(Інвестиційна рада)



Хто є хто: Матриця ролей в екосистемі DREAM



Головний орган управління

Функція: Призначає організацію, відповідальну за ЄПП.



Відповідальний за ЄПП

Управління ЄПП

Функція: Створює відбори, призначає експертів, фіксує рішення ради.



Власник секторального портфеля

Формування заявок в ЄПП

Функція: Подає відібрані проєкти на загальний розгляд.



Оцінювач

Функція: Проводить галузеву (економічну, фінансову) експертизу.




Місцева інвестиційна рада

Функція: Працює виключно в ОФЛАЙН-режимі. Ухвалює фінальне рішення.

Крок 1: Делегування повноважень та старт процесу

Формування ЄПП починається з налаштувань у кабінеті Головного органу управління. Рішення щодо відповідальної організації приймається самостійно (окремий підрозділ або сам орган).

Ключова дія: Адміністратор повинен надати повноваження «Управління ЄПП» уповноваженому співробітнику. Без цього ключа двері до створення портфеля залишаються зачиненими.

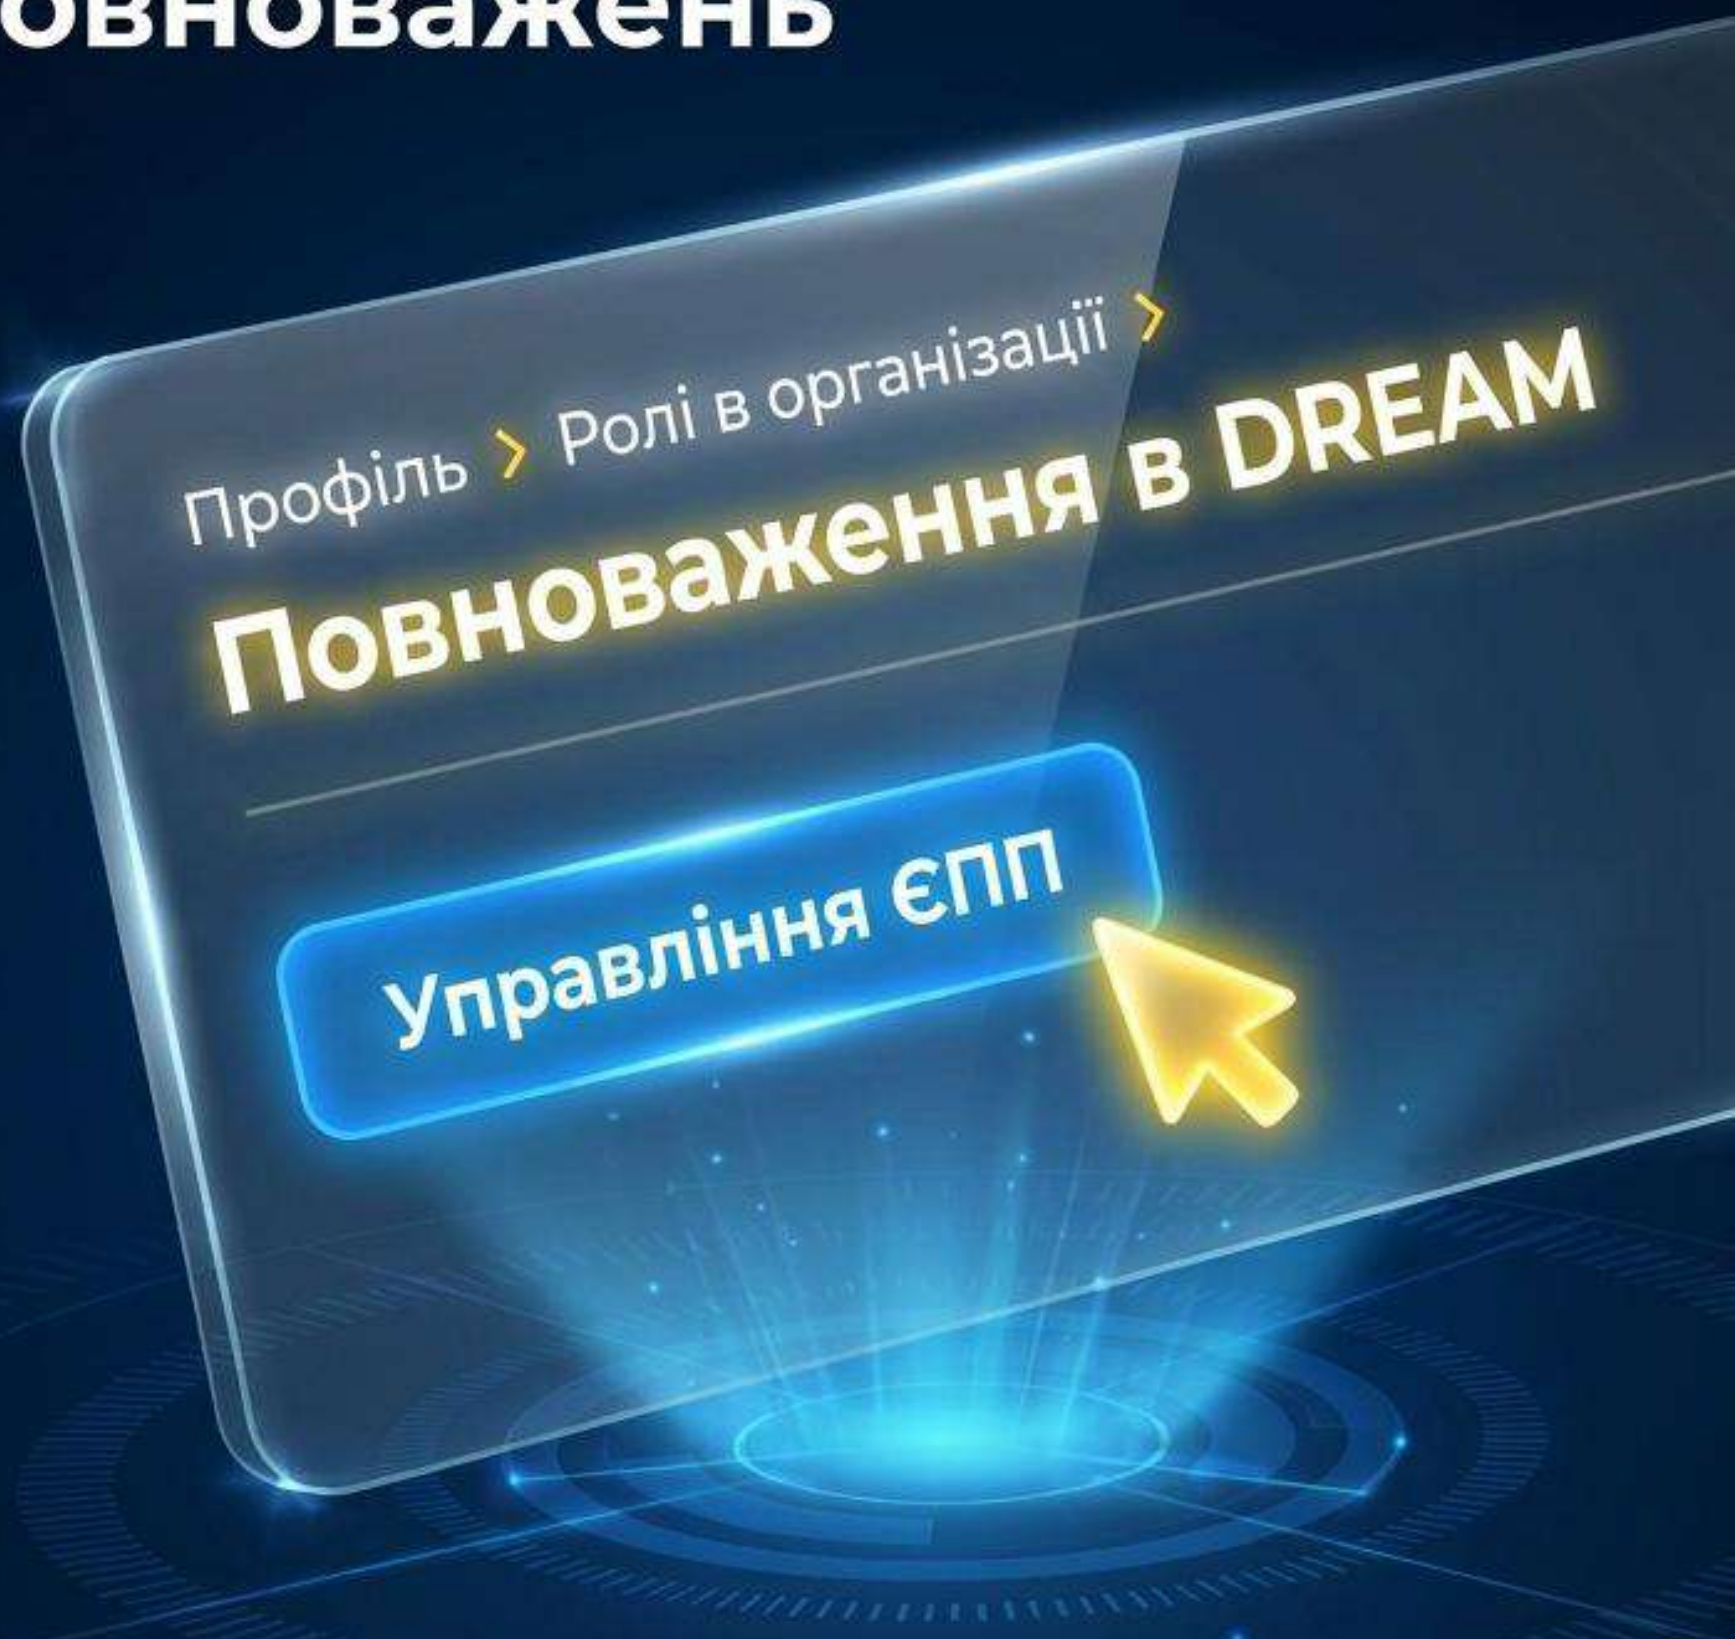

Крок 2: Конструктор правил відбору

Організація, відповідальна за ЄПП, відкриває раунд відбору та визначає «правила гри».

Компонент (Тема)

Загальна парасолька для ініціатив.



Раунд відбору

Чіткі дати старту та фінішу прийому заявок.

Експертиза

Призначення оцінювачів та фіксація тривалості їхньої роботи (у добах).

Додати елемент

Раунди відбору

Тривалість

2

Вимір

Доба



Період прийому заявок

16.10.2025



21.10.2025



Зберегти в DREAM

Крок 3: Трансфер заявок із секторальних портфелів

Відповідальні за секторальні портфелі обирають найкращі ініціативи та ініціюють їх перехід на загальний розгляд до ЄПП. Для цього необхідні права «Формування заявок в ЄПП».

Секторальний портфель



Капітальний ремонт базової кухні на території ЗСШ №32

Соціальна сфера

Капітальний ремонт базової кухні на території ЗСШ №32



Заявки до ЄПП



До експертної заявки 0 **Подати заявку**

Подати заявку

УВАГА!

**Правило
послідовності.**

1) Прийом заявок

2) Експертна оцінка

Раунд відбору складається з двох фаз: 1) Прийом заявок, 2) Експертна оцінка. Ці процеси не можуть перетинатися. Поки триває прийом заявок – оцінка недоступна. Після старту оцінки – прийом закривається.

Крок 4: Тривимірна експертна оцінка

Після закриття вікна подачі заявок до роботи стають Оцінювачі. Кожен експерт аналізує проект виключно в межах своєї компетенції, формуючи комплексний профіль ініціативи в системі DREAM.

Регіональна — Відповідність стратегіям розвитку громад.

Економічна — Доцільність та вплив на економіку.

Фінансова — Розрахунок бюджету та спроможність реалізації.



Хто проводить експертну оцінку?




Три профілі експертної оцінки



Гнучкість системи: Оцінку може виконувати як одна організація-універсал (усі 3 профілі), так і декілька вузькопрофільних підрозділів (кожен за свій напрямок).

Маршрутизація оцінки: Паралельна vs Послідовна

Паралельна оцінка

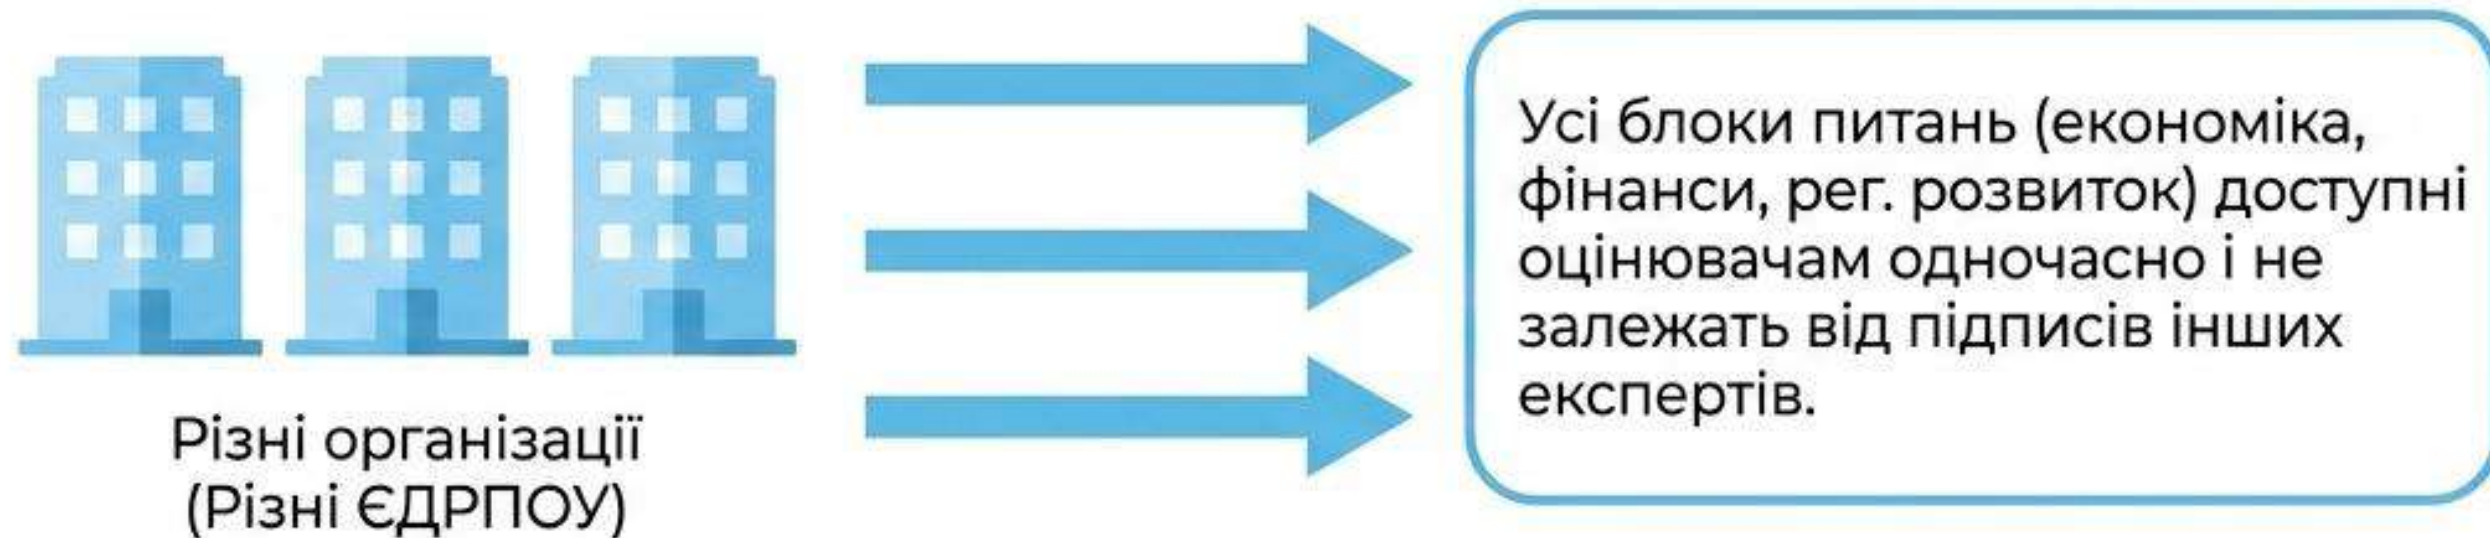

Послідовна оцінка



Блокуючі питання: Критичний фільтр проєкту



Отримання цифрових повноважень

Шевченко Тарас Григорович

Профіль

Ролі в організації

Повноваження в DREAM

Погодження / експертне оцінювання заявок в ЄПП ×

Роль Адміністратора

Експертна оцінка недоступна за замовчуванням. Доступ (цифровий ключ) надає **Адміністратор** вашої організації.

Необхідне повноваження


У налаштуваннях профілю спеціаліста має бути активовано статус:

Погодження / експертне оцінювання заявок в ЄПП ×

Результат

Тільки після цього уповноважена особа зможе відкривати чек-листи, зберігати результати та накладати КЕП (кваліфікований електронний підпис).

Навігація та пошук заявок в системі

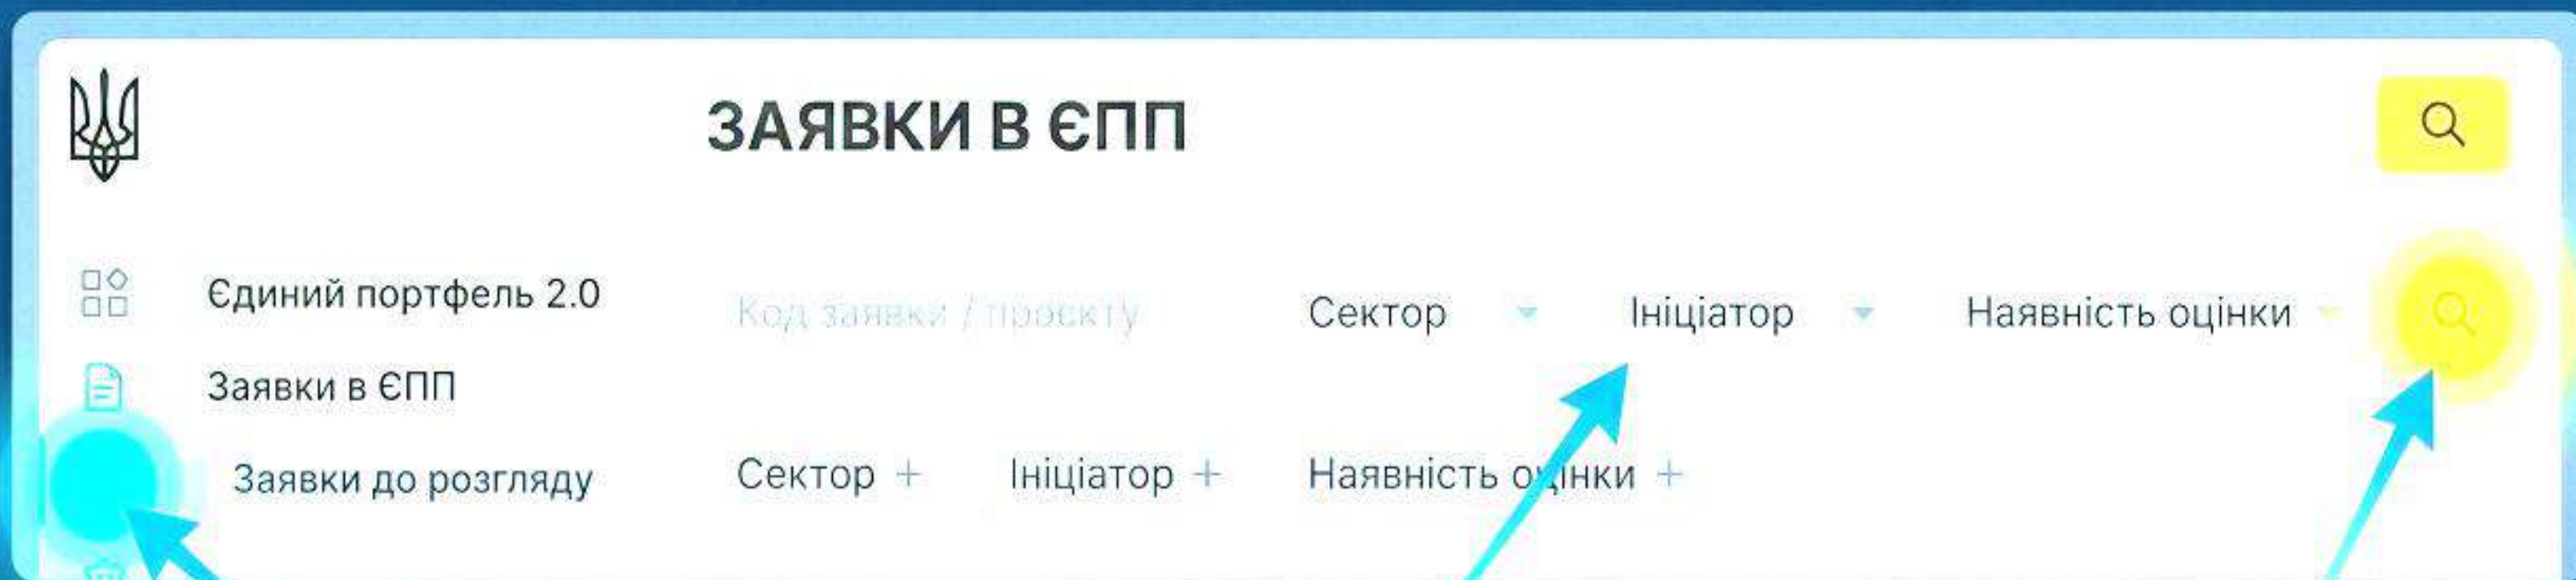

1. Локація:

Розділ меню зліва: «Єдиний портфель 2.0» → «Заявки в ЄПП».
Вкладка: «Заявки до розгляду».

2. Розумні фільтри:

Система дозволяє фільтрувати сотні заявок за трьома критеріями:

- **Сектор** (наприклад, почніть вводити 'Освіта' для пошуку коду 1800)
- **Ініціатор** заявки
- **Наявність оцінки** (щоб відсіяти вже опрацьовані)

3. Ключова дія (Увага!):

Фільтри не застосовуються автоматично! Обов'язково натисніть іконку лупи (Пошук), щоб застосувати вибрані показники.

Життєвий цикл заявки: Статуси в ЄПП

Активні

(Вкладка «Заявки до розгляду»)

Експертне оцінювання

очікує вашої дії

Експертне оцінювання

частково або повністю
оцінено експертами

Транзит

(Вкладка «Розглянуті заявки»)

Очікує розгляду

*Робота експерта завершена.
Заявка чекає на фінальне
рішення місцевої інвестиційної
ради.
Примітка: сюди потрапляють і
підписані оцінки, і ті, що не
були оцінені взагалі.*

Фінал

(Вкладка «Розглянуті заявки»)

Схвалено до ЄПП

Рішення ради підписане

Не схвалено до ЄПП

Рішення ради негативне

Скасовано / Відкликано / Не оцінювалось

Відхилення процесу


Процес оцінювання крок за кроком

1. Відкриття картки




Переконайтеся, що поточний час входить у вікно оцінювання (система покаже дати відбору).

2. Вибір результату



Оцініть питання виключно у межах вашого профілю перевірки.

3. Обґрунтування (Обов'язково!)



Якщо обрано «Частково» або «Ні», поле коментаря стає обов'язковим. Ви повинні детально вказати, що саме потребує доопрацювання ініціатором.

Архітектура чек-листа: Рівні оцінювання

DREAM Відбір до єдиного портфелю проектів і програм
ЗАЯВКА НА ВКЛЮЧЕННЯ В ЄПП #170226-65E81315

ЗАЯВКА НА ВКЛЮЧЕННЯ В ЄПП

ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЩОДО ВКЛЮЧЕННЯ В ЄПП

Предмет розгляду
Інвестиційне ТСО

ЧЕК-ЛИСТ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ
Проведіть оцінювання, надавши відповіді на запитання чек-листу, використовуючи інформацію, що міститься в проекті (програмі)

[☒] РІВЕНЬ ПРОЄКТА

☒ Базовий рівень. Тут містяться питання загального характеру:
☒ Відповідність державним та регіональним програмам.
☐ (Обов'язково для економіки та розвитку).
☒ Альтернативне технічне рішення 1 "Рішення 1"
☐ Пахпаліх тхадініях проєкції "Рішення 1"
☐ Рівень рішень. Специфічні оцінка ринку).

[☒] АЛЬТЕРНАТИВНЕ ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ 1 "РІШЕННЯ 1"

Зберегти оцінку

Підписати

[☒] РІВЕНЬ ПРОЄКТА

Базовий рівень. Тут містяться питання загального характеру: стратегічна доцільність, відповідність державним та регіональним програмам. (Обов'язково для економіки та рег. розвитку).

[☒] АЛЬТЕРНАТИВНЕ ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ 1 "РІШЕННЯ 1"

Рівень рішень. Специфічні питання комерційного та фінансового обґрунтування щодо конкретного варіанту реалізації (стратегія закупівель, оцінка ринку).



Не пропустіть! Перевіряйте всі вкладки технічних рішень. Зберегти оцінку можна лише тоді, коли активовані всі чек-боксы у всіх блоках вашого профілю.

Фіналізація: Збереження vs Підписання



Зберегти оцінку

Робоча чернетка

- Доступно лише після надання відповідей на ВСІ питання блоку.
- До оцінки можна повертатися і редагувати.
- Не має юридичної сили для інвестиційної ради.



Підписати

Юридична фіксація

- Накладається КЕП уповноваженої особи.
- Редагування після підпису неможливе!
- Тільки підписані (або не оцінені взагалі) заявки йдуть на розгляд ради.


Пакетне підписання: Щоб не підписувати кожную заявку окремо, виберіть кілька проектів галочками у списку заявок та застосуйте підпис до всього пакету одночасно.

Додаток: Матриця складності чек-листів

	Проект < 50 млн грн	Проект > 50 млн грн (одне або два ТЕО)	Програма
Стратегічне обґрунтування (Блокуючі)	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Економічне обґрунтування	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
Комерційне обґрунтування	Спрощено: фокус на стратегічній відповідності та точних кошторисах.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓Максимальна глибина: глибокий аналіз ринку, ДПП та аналіз чутливості.	Макро-рівень: оцінка загальних цілей та сукупної вартості.
Фінансове обґрунтування (Блокуючі)	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
Управлінське обґрунтування	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	

Крок 5: Формування шорт-листа через DREAM Аналітику

Система автоматично агрегує результати оцінки. Відповідальний за ЄПП використовує модуль аналітики для створення фінального переліку.

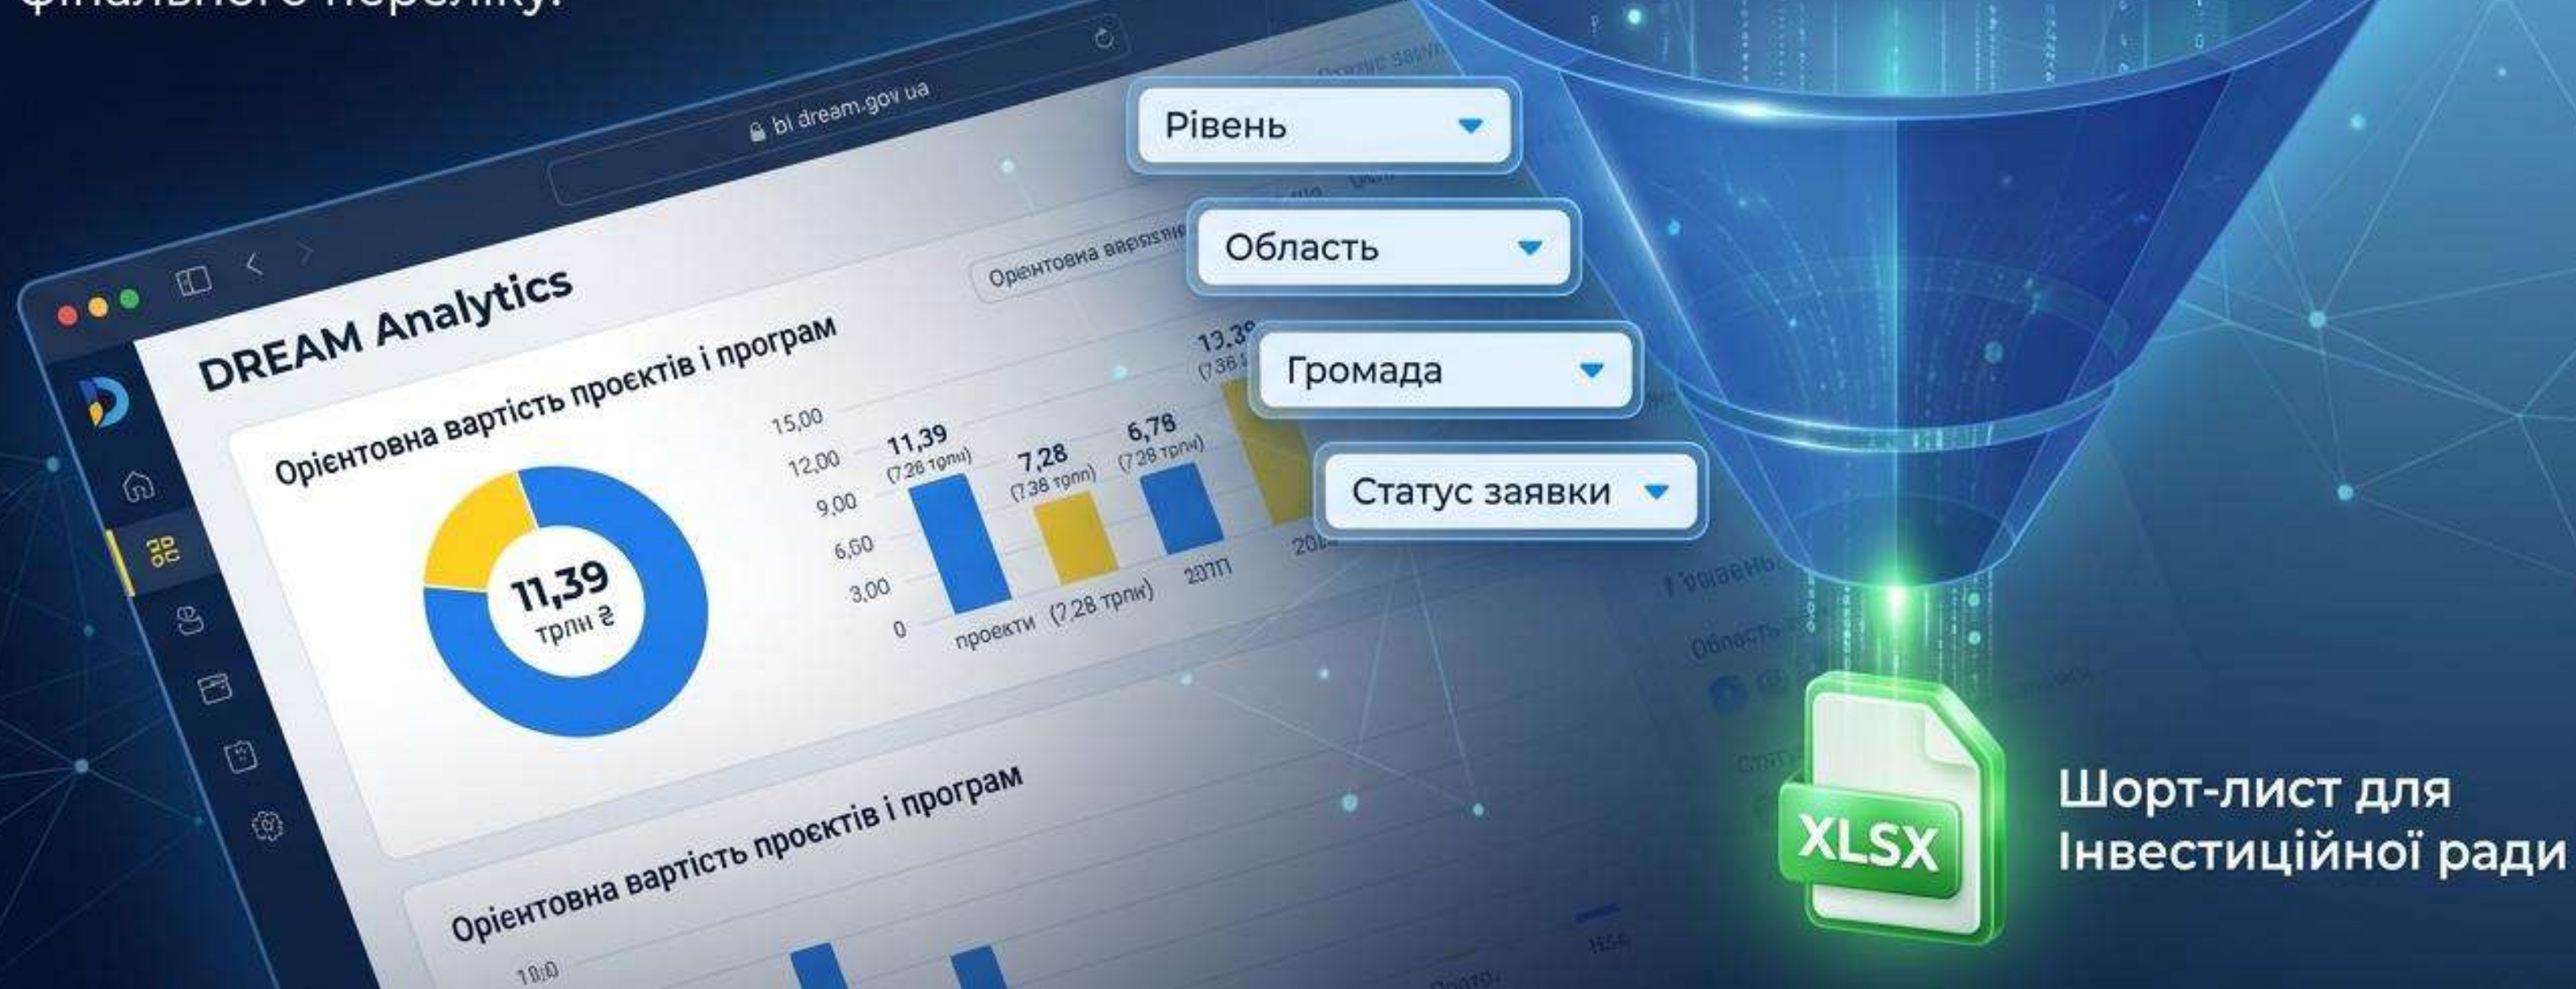


Кроки 6 та 7: Синхронізація офлайн-рішень із цифровим світом

Світ Фізичний (Офлайн) — КРОК 6



Місцева інвестиційна рада збирається наживо. Вона розглядає експортований шлях проєктів та ухвалює остаточне рішення. У системі DREAM дії ради не передбачені.

Світ Цифровий (Онлайн) — КРОК 7

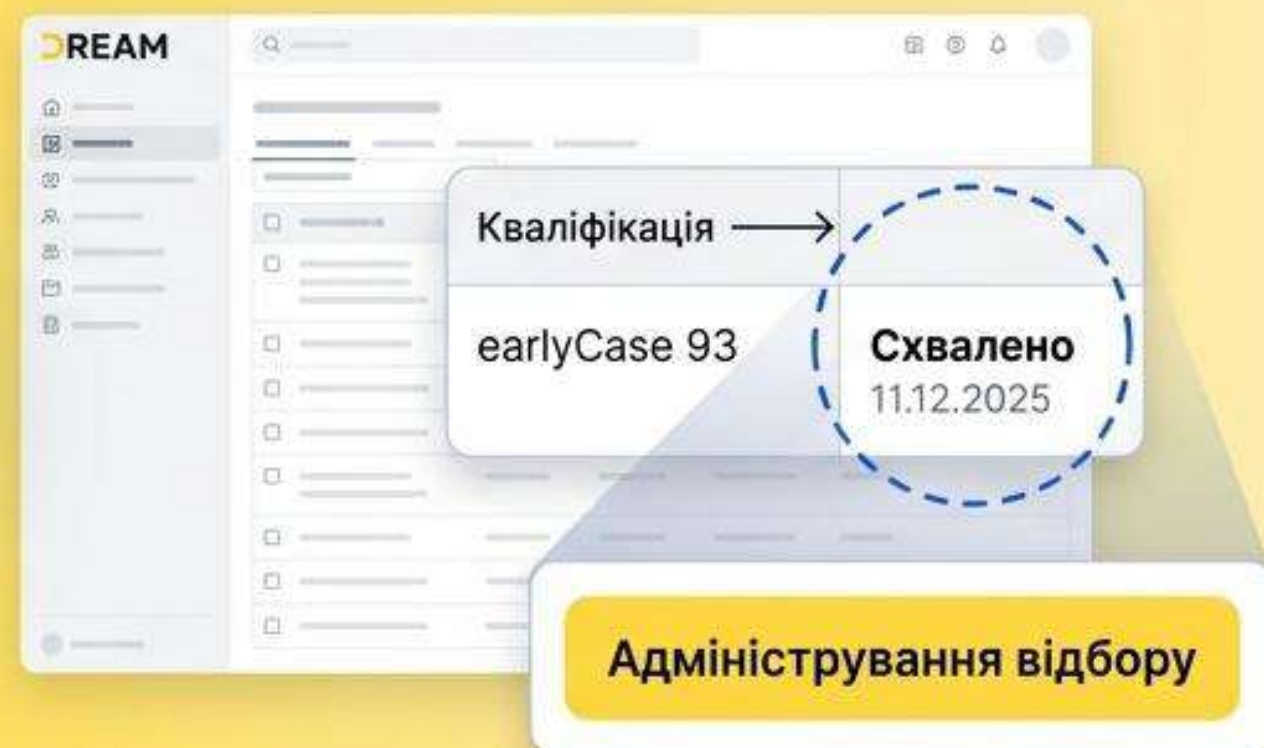

Відповідальний за ЄПП повертається до системи (повноваження «Управління ЄПП - implementer»). Він фіксує рішення ради (схвалено/не схвалено), формуючи цифровий протокол.

Рівень зрілості (Maturity): Індексція готовності

Щойно проєкт проходить усі етапи схвалення, система автоматично розраховує його Рівень зрілості.
Це ключовий маркер для інвесторів, що відображає якість опрацювання ініціативи.



Кваліфікація:
earlyCase
93

Електронний кабінет DREAM

Вкладка «Заявки до розгляду»
-> Фільтр «Кваліфікаційна система»

DREAM Аналітика

Дашборд експертної оцінки

Публічний портал

У відкритому доступі
на сторінці громади

Прозорість та гнучкість: Управління публічним портфелем

Затверджений ЄПП одразу стає видимим для громадськості та міжнародних донорів на публічному порталі. Портфель — це не статичний документ, а живий механізм.



Control Panel



Виключити з ЄПП

Процедура виключення: Якщо проєкт втрачає актуальність або змінюються пріоритети громади, передбачена офіційна дія вилучення. Це гарантує, що ваш портфель завжди репрезентує лише найактуальніші інвестиційні потреби.

Від громади до держави: Масштабування інвестицій

Формування місцевого портфеля — це лише початок. Система DREAM працює як цифровий ліфт для ваших ініціатив.

Крок 3: ЄПП Держави

Національне фінансування: Найкращі та найбільш зрілі проекти отримують прямий доступ до механізмів розподілу публічних інвестицій.

Ваша робота сьогодні формує архітектуру відбудови країни завтра.

Крок 2: ЄПП Громади/Регіону

Галузева ескалація: Після місцевого затвердження проект переходить для оцінки міністерствами.

Крок 1: Ініціатива Громади

Локальний старт: Ініціатор формує заявку та доводить її до загального списку.

Практичне завдання:

Розробити Дорожню карту формування ЄПП громади

Фундамент: 10 кроків готовності громади до СПІ

Без цього фундаменту переходити до збору ідей — марна трата часу.



Стратегія:
Стратегія розвитку
громади актуальна.



План заходів:
План заходів
актуалізований.



Пріоритети:
Чітко визначені
напрями
інвестування.



Галуzeвий аналіз:
Проведено
секторальну
аналітику проблем.



Статистика:
Зібрана актуальна
статистика
(фактичні дані).



Індикатори:
Визначені цільові
показники та індикатори
досягнення.



Фінанси:
Пораховані орієнтовні
фінансові потреби.



Перехідні проекти:
Сформовано перелік
діючих проектів.



Джерела:
Визначені потенційні
джерела фінансування
(не 0 грн).



Документи:
Підготовлені вихідні
дані по пріоритетних
проектах.

Механіка дії: Процес формування Єдиного проектного портфеля (ЄПП)

Від первинного відбору «сирих» ідей до затвердження радою



Дякую за увагу!

З повагою, Наталія ГРИНЧУК
